

迁安沙河驿世润德环保科技有限公司
“3·12”一般坍塌事故
调查报告

迁安市人民政府事故调查组
2025年6月9日

目 录

一、事故基本情况.....	2 -
(一) 事故发生单位概况.....	2 -
(二) 事故相关单位概况.....	2 -
(三) 合同签订情况.....	3 -
(四) 事故发生单位安全管理情况.....	4 -
(五) 事故相关单位安全管理情况.....	5 -
(六) 鑫达钢铁公司履职情况.....	5 -
(七) 事故发生经过.....	6 -
(八) 事故现场勘验情况.....	7 -
(九) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	8 -
二、事故应急处置及评估情况.....	9 -
(一) 事故信息接报及响应情况.....	9 -
(二) 事故现场应急处置情况.....	9 -
(三) 医疗救治和善后情况.....	9 -
(四) 事故应急处置评估情况.....	10 -
三、事故原因分析.....	10 -
(一) 直接原因.....	10 -
(二) 间接原因.....	10 -
四、有关单位存在的问题.....	11 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	11 -
(一) 不予追究责任人员 (1 人)	11 -
(二) 对有关公职人员的处理建议 (2 人)	11 -
(三) 对事故有关责任人员的行政处罚建议 (2 人)	12 -
(四) 对事故责任单位的行政处罚建议.....	12 -
(五) 其他处理建议.....	13 -
(六) 建议对有关单位及人员进行另案处理.....	13 -

六、事故防范和整改措施建议.....	- 14 -
--------------------	--------

2025年3月12日14时40分左右，世润德环保科技有限公司在一体化浊环水净化装置更换斜板填料作业过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

世润德环保科技有限公司直至19时40分上报迁安市应急管理局，未在规定时间内上报事故，造成迟报。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年3月14日，迁安市人民政府成立了由市应急管理局牵头、市公安局和市总工会等单位有关人员参加的世润德环保科技有限公司“3·12”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请了三名冶金行业专家组成专家组参与事故调查。迁安市纪委监委成立了事故追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。迁安市纪委监委提出了对有关公职人员的处理建议。

经调查认定，世润德环保科技有限公司“3·12”坍塌事故是一起因工人违章作业、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

世润德环保科技有限公司（以下简称“世润德公司”）位于徐州市泉山区江苏建筑职业技术学院大学科技园3号楼301室，成立于2011年03月22日，营业期限至2031年03月21日，注册资本6100万元整，法定代表人：刘源，统一社会信用代码为913203035713790774，经营范围：环保设备研发、组装、销售；环保技术咨询服务；水处理工程、市政工程设计、施工；微生物技术研发、技术推广；环保检测仪器生产、销售、维护；水处理设备组装、销售等。安全生产许可证编号：（苏）JZ安许证字[2018]000572。有效期：2024年2月1日至2027年2月20日。建筑业企业资质证书编号：D232288787，有效期：2025年10月10日。公司现有职工10人，其中安全管理人员1人。

（二）事故相关单位概况

河北鑫达钢铁集团有限公司（以下简称“鑫达钢铁公司”）位于河北省迁安市沙河驿镇上炉村东，成立于2002年10月16日，营业期限至2052年10月15日，注册资本陆亿叁仟零叁拾万元整，法定代表人为王继兴，统一社会信用代码为91130283743423645P，经营范围：炼铁；炼钢；轧钢；球团铁矿、烧结铁矿、铸铁件制造；钢材、铁精矿粉、白云石、石灰石、铁矿石、膨润土、预包装食品批发；普通货运；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。公司现有职工7100余

人，设有独立的安全管理机构，安全管理人员 150 人。

（三）合同签订情况

鑫达钢铁公司轧钢总厂一体化浊环水净化装置需要维修，需委托有资质的单位进行施工作业。

2024 年 12 月 10 日，鑫达钢铁公司（甲方）与世润德公司（乙方）签订了《板带厂带钢产线浊环水净化装置及加药罐内衬外修项目合同》。合同约定甲方负责提供所需的电、气、水等外部条件，乙方负责完成维修内容并质保 3 年。

2025 年 2 月 23 日，鑫达钢铁公司（甲方）与世润德公司（乙方）签订了安全管理协议书。双方安全管理责任有：1.甲方对乙方资质进行审查，严禁将项目（工程）承包给不具备相应资质的单位；2.乙方必须依法设立安全管理机构，配备安全管理人员，建立健全安全生产管理网络；3.乙方必须建立健全本单位安全生产责任制、规章制度及安全操作规程，并向甲方备案；4.甲方应当建立健全相关方事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告；5.乙方应当定期开展隐患排查治理工作（领导每月至少检查 1 次，专业每月检查不少于 2 次，安全管理人员每周检查不少于 2 次，班组每班检查不少于 1 次），制定安全检查表（在甲方备案）并按检查内容进行检查，确保查出的隐患问题得到有效处理；6.甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导；7.乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员定期

进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识；8.乙方负责工伤认定和事故上报工作。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构情况

世润德公司由总经理刘源（持有主要负责人资格证）负责公司全面管理工作；世润德公司向鑫达钢铁公司报备的专职安全生产管理人员为孙利锋（持有高级安全资格证书），但在实际作业过程中孙利锋未从事安全管理工作；项目负责人何培军（未取得项目负责人或安全管理人员资格证）负责驻鑫达钢铁公司项目的全面工作，同时实际负责项目的安全生产管理工作。

2.安全管理制度建立情况

世润德公司建立了企业安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故应急救援预案等制度。世润德公司制定了施工安全方案和带钢一体化罐更换填料作业方案。

3.安全教育培训情况

2月22日和3月8日，世润德公司对入厂作业人员进行了安全教育培训。3月12日通过私下雇佣的安书鑫未经过安全教育培训，也未将雇佣安书鑫的情况上报鑫达钢铁公司。

4.施工项目现场管理情况

世润德公司施工项目负责人为何培军。世润德公司依据项目整体工作进度安排工作，工作安排和现场管理都由何培军负责。

5.事故相关工艺流程

涉事工艺为维修内容中罐体内部斜板填料换新部分。

斜板填料换新流程：1.作业人员通过浊环水净化罐人孔进入罐体内部采取分段拆除、支撑加固的方式拆除旧的斜板填料，最后使用扳手等工具拆除边铁支架；2.斜板填料为塑料质地。作业人员用电烙铁将单独的斜板填料烫接固定成斜板填料单元，方便后续安装；3.作业人员根据设计图纸安装固定新边铁支架；4.将斜板填料单元在支架上从下到上、从左到右进行组装。

（五）事故相关单位安全管理情况

鑫达钢铁公司设立了安全部，成立了安全生产委员会，各分厂有安全科长和安全员，现有安全管理人员 150 名。鑫达钢铁公司制定了全员安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、生产安全事故综合应急救援预案、外委施工安全管理制度等。

（六）鑫达钢铁公司履职情况

2025 年 2 月 22 日，鑫达钢铁公司对世润德公司进行了资质审查，包括项目合同复印件、营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、主要负责人证和安全管理人员证书、安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、缴纳意外保险凭证复印件、劳动合同等；2 月 22 日，鑫达钢铁公司对世润德公司 5 名入厂作业人员进行了安全教育培训；2 月 23 日，鑫达钢铁公司对世润德公司施工方案进行了会审，与其签订了

《安全管理协议书》，并进行安全告知；2月23日，鑫达钢铁公司对世润德公司进行了开工审查批准，并安排轧钢总厂运行技师李文武每天在世润德公司工作区域巡视检查；2月23日、3月7日和3月10日，鑫达钢铁公司对世润德公司安全管理情况进行检查，下达了3次安全隐患整改通知单，发现的安全隐患全部整改到位。3月8日，鑫达钢铁公司对世润德公司9名入厂作业人员进行了安全教育培训。

（七）事故发生经过

因鑫达钢铁公司轧钢总厂一体化浊环水净化装置需要维修，鑫达钢铁公司与世润德公司签订项目合同，约定由世润德公司完成维修内容。

2025年3月12日7时，世润德公司项目负责人何培军未召开班前会，也未对现场人员进行安全交底，便安排王振波（持有焊接与热切割作业证）、孙利锋等5人负责斜板填料的拆除和安装，安排李学壮、王建伟等8人对拆除的斜板填料进行清洗。8时30分左右，李文武对世润德公司施工区域进行了巡视检查，未发现安全隐患，随后前往轧钢总厂其他区域进行流动巡视。9时许，何培军私下找到鑫达钢铁公司轧钢总厂调度杨英，因焊工人手不够，希望杨英介绍一名焊工到工地现场负责边铁支架拆除工作。杨英私下通过微信用户“A李二少”在兼职微信群招到安书鑫，介绍给何培军。11时35分，安书鑫在3号门车辆通道抬杆时趁安保人员不注意私自步行进入鑫达钢铁

公司厂区并前往填料换新项目工地。此次何培军临时雇佣安书鑫进厂未向鑫达钢铁公司报告，鑫达钢铁公司不知情。

下午 13 时开工，安书鑫被安排到东区 1 号罐内拆除边铁支架，李学壮等 3 名清洗工人在罐外等候，准备下一步拆除斜板填料并清洗。14 时 40 分许，安书鑫爬上脚手架通过圆形人孔（距地面 3.15 米直径 0.86 米）进入罐体内部，在旧的斜板填料未拆除的情况下，直接使用等离子焊切割边铁支架。由于斜板填料及其内部淤泥的重量较大，斜板填料发生垮塌，将安书鑫挤在填料和罐壁之间受伤。

（八）事故现场勘验情况

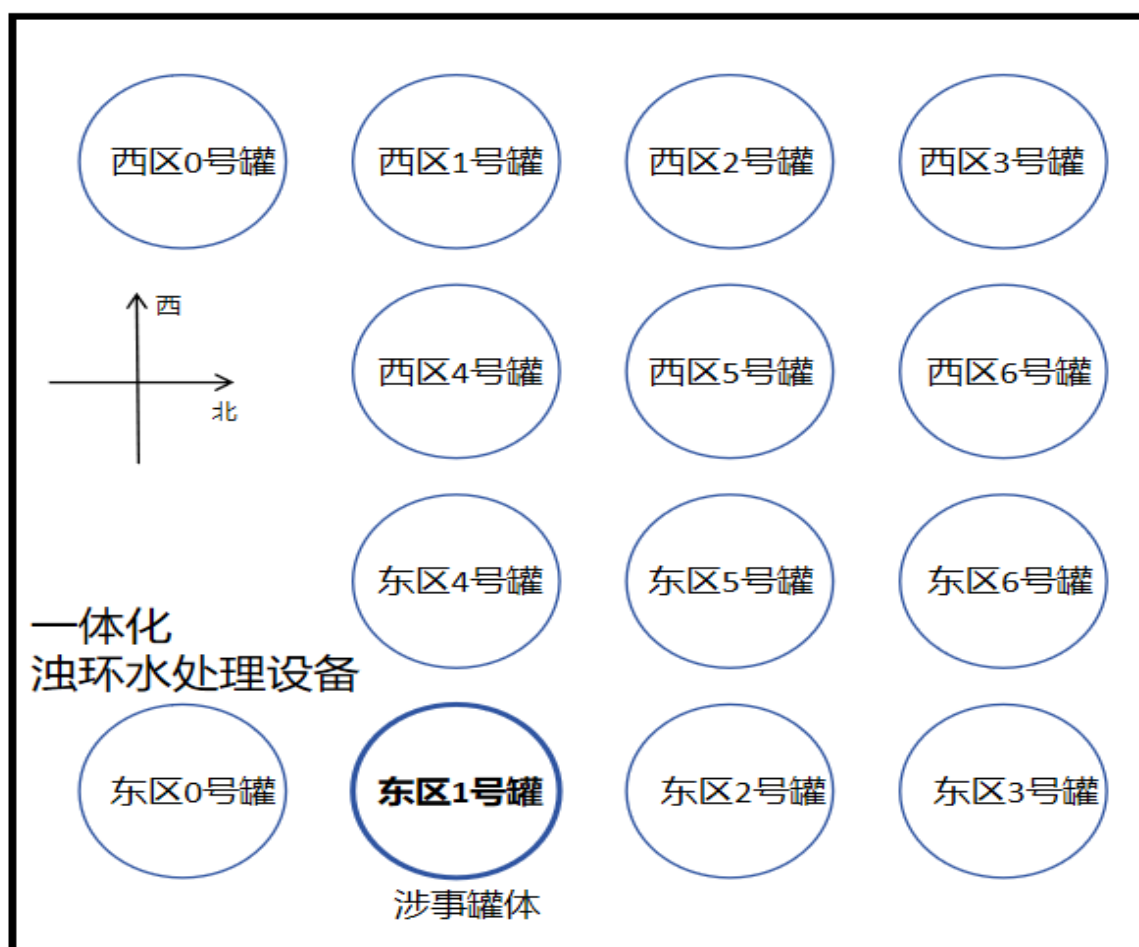


图 1 涉事区域俯视示意图

经现场勘验，事故发生地为鑫达钢铁公司轧钢总厂一体化浊环水净化装置东区 1#罐（罐体直径 4 米）处，安书鑫作业时站立在罐内走台处。

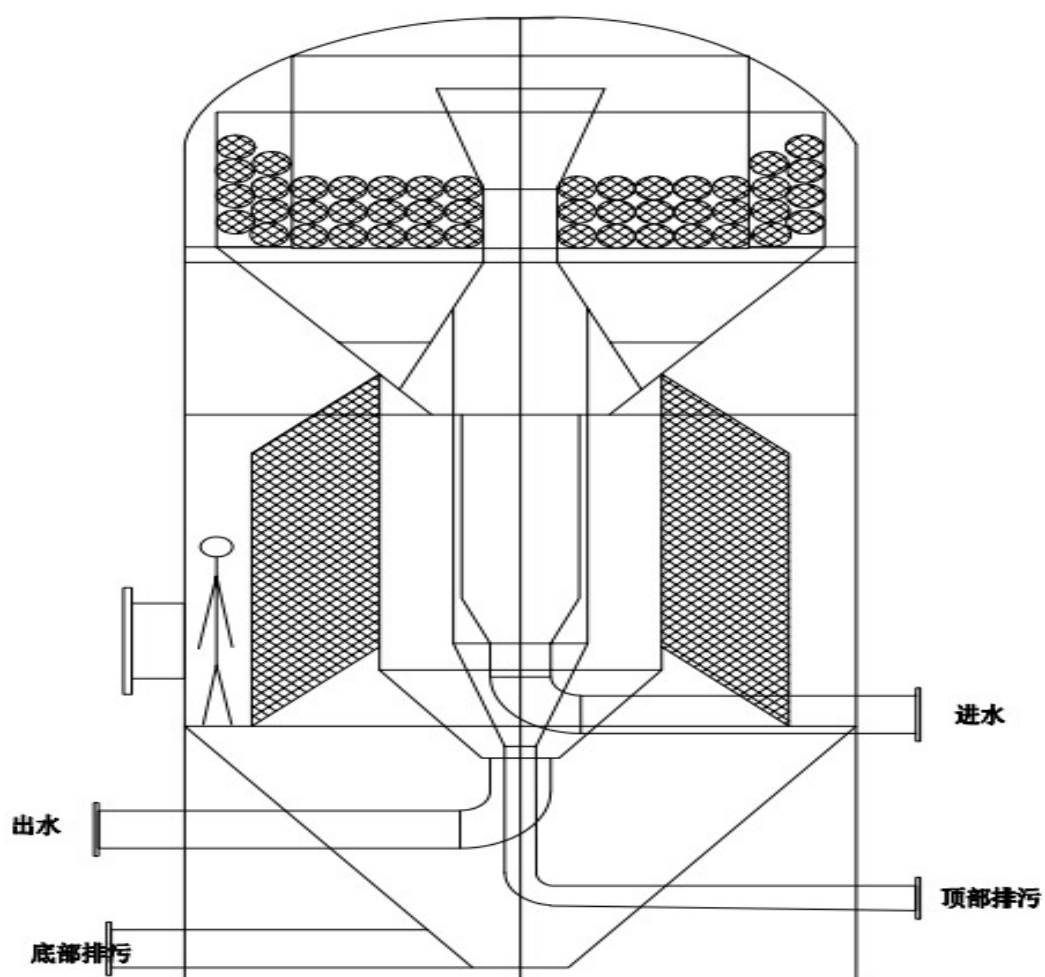


图 2 事故现场还原图

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故共造成直接经济损失 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

李学壮发现安书鑫受伤以后，立即上报了项目负责人何培军，何培军电话上报了公司总经理刘源，同时上报给了李文武，李文武上报给了轧钢总厂厂长蔡芝东，蔡芝东上报至安全部副部长李景兵和安全副总王建学。刘源通知何培军做好伤员救治工作。鑫达钢铁公司在得知事故情况后，将迁安市应急管理局电话告知世润德公司。19时40分，刘源安排何培军将该起事故上报至迁安市应急管理局，造成迟报。

迁安市人民政府接报后，迁安市应急管理局、迁安市公安局和沙河驿镇人民政府第一时间赶赴现场处理。

（二）事故现场应急处置情况

李学壮发现安书鑫受伤以后，立即拨打了“120”急救电话，现场多名工人对其进行了救援，发现填料很重无法开展救援后，李学壮拨打了“119”救援电话。消防救援人员到达现场后用扩张器开始对被挤压的安书鑫进行救援，于18时20分左右成功将安书鑫救出。

迁安市应急管理局、迁安市公安局等职能部门到达现场后立即采取应急处置措施，保护事发现场，对事故现场进行封控。

（三）医疗救治和善后情况

“120”救护车第一时间将安书鑫拉往迁安市中医医院进行救治，19时左右，安书鑫经抢救无效死亡。

事故发生后，4月14日世润德公司与死者家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场工人积极开展救援，应急救援及时，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

安书鑫在东区1号罐内拆除斜板填料时违反《带钢一体化罐更换填料作业方案》中拆除施工的规定^[1]，直接切割边铁支架，造成填料整体坍塌，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.世润德公司安全教育培训不到位。项目负责人何培军在作业前未对安书鑫进行安全教育培训及安全交底，未能提前告知安书鑫现场存在危险因素和防范措施。

2.世润德公司隐患排查不到位。未制定安全检查表，未对作业现场进行隐患排查及职工违章行为检查，未能及时发现现场作业人员违规作业的情况。

3.世润德公司现场安全管理不到位。未在切割作业现场安排专人进行现场安全管理，未能及时发现并制止作业人员的违规行为。

^[1] 《带钢一体化罐更换填料作业方案》中拆除施工规定：有序拆除，按照一定的顺序进行拆除，避免混乱和无序操作。从上到下，一片一片进行拆除，有序操作，确保拆除过程的稳定性。

四、有关单位存在的问题

（一）鑫达钢铁公司按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定和安全管理协议书履行了作为发包单位的安全生产管理职责，但未发现世润德公司私下雇佣人员进厂作业，对世润德公司的统一协调管理存在欠缺。

（二）2025年1月至3月，迁安市沙河驿镇人民政府共召开3次安全生产专题会议，印发了《沙河驿镇岁末年初安全风险防范工作方案》。沙河驿镇人民政府应急办对鑫达钢铁公司开展了督导检查6次，发现安全隐患5项，检查发现安全隐患均在规定时间内整改完成。但未发现世润德公司作业生产过程中的安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员（1人）

1.安书鑫，世润德公司临时雇佣工。在工作过程中违反安全操作规程，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（2人）

1.刘海棠，迁安市沙河驿镇人民政府一级主任科员，负责应急管理 and 环境保护等方面工作。落实安全生产责任制不到位，贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动不到位。建议按照干部管理权限进行处理。

2.张志强，迁安市沙河驿镇人民政府应急管理办公室副主任，

牵头负责安全生产方面工作。对世润德公司监督检查不到位，未及时发现生产过程中的安全隐患。建议按照干部管理权限进行处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

1.刘源，世润德公司总经理，负责公司的全面工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全隐患，对事故发生负有重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由迁安市应急管理局给予行政处罚；接到事故报告后迟报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条规定，建议由迁安市应急管理局给予行政处罚。

2.何培军，世润德公司项目负责人，实际负责驻鑫达钢铁公司项目的安全生产管理工作。组织本单位安全生产教育不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（六）项的规定，建议由迁安市应急管理局给予行政处罚。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1.世润德公司对职工的安全教育和培训不到位，对现场的安全检查不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款和第四十一条第二款规定，建议由迁安市应急管理局给予世润德公司行政处罚。

（五）其他处理建议

建议迁安市沙河驿镇人民政府向迁安市政府作出深刻检查。依据《迁安市安全生产约谈实施办法（试行）》第四条第（一）项的规定，建议由市安委会副主任约谈迁安市沙河驿镇人民政府主要负责人。

（六）建议对有关单位及人员进行另案处理

1.鑫达钢铁公司未发现世润德公司私下雇佣人员进厂作业，对世润德公司的统一协调管理存在欠缺。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由迁安市应急管理局对鑫达钢铁公司进行另案处理。

2.蔡芝东，鑫达钢铁公司轧钢总厂厂长，负责轧钢总厂的全面工作。未发现世润德公司私下雇佣人员进厂作业，对世润德公司的统一协调管理存在欠缺。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由迁安市应急管理局对蔡芝东进行另案处理。

3.王林，鑫达钢铁公司轧钢总厂安全科长，负责轧钢总厂的安全工作。未发现世润德公司私下雇佣人员进厂作业，对世润德公司的统一协调管理存在欠缺。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由迁安市应急管理局对王林进行另案处理。

4.因鑫达钢铁公司保卫人员未发现世润德公司私下雇佣的安书鑫进厂作业，建议鑫达钢铁公司按照公司内部管理制度对相

关人员进行内部处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）世润德公司要加强对职工的教育培训力度。世润德公司要加强职工的安全教育培训及安全交底，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，提高职工的安全素质及安全意识，减少职工作业过程中的违规行为，消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）世润德公司要加强作业现场安全管理。世润德公司要将特种作业人员持证上岗及作业方案执行情况纳入日常检查重点。要严格落实危险作业许可证制度，对危险作业实行许可制度，明确作业范围和作业时间，做好作业前的检查和安全保障措施，确保人员安全。

（三）世润德公司要认真落实安全监护人制度。世润德公司要根据危险作业相关要求，涉及危险作业项目必须设专人监护，安全监护人要发挥监护职责，及时发现并制止职工作业过程中的违规行为，确保作业人员安全。

（四）沙河驿镇人民政府要严格落实属地管理责任。沙河驿镇人民政府要加强对安全生产工作的领导，严格落实属地监管责任。要进一步摸清辖区内工贸行业企业基本情况，加强安全监管，尤其是要加强对生产经营单位外包工程和外委施工单位的监督检查，防范化解风险隐患，杜绝类似事故再次发生。

（五）鑫达钢铁公司要强化外委施工单位安全监管。鑫达钢铁公司要加强对外委施工单位的监督管理力度，对外委施工单位的的安全生产工作实施统一协调、管理。加强门禁管理，对无证人员车辆进厂手续严格审核，杜绝无证、无手续人员和车辆进入厂区，同时对外委施工现场定期进行安全检查，发现问题及时督促整改，确保外委施工作业安全。
