

南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目“5·16” 一般起重伤害事故调查报告

南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目“5·16”

一般起重伤害事故调查组

2023 年 10 月

目 录

一、事故基本情况2

 (一) 工程项目概况 2

 (二) 相关单位基本情况 2

 (三) 事故现场勘验情况 4

 (四) 死亡人员基本情况 5

二、事故发生经过及应急处置情况 5

 (一) 事故发生经过 5

 (二) 应急救援和善后处置情况 6

三、事故原因分析7

 (一) 事故直接原因 7

 (二) 事故间接原因 8

四、调查发现的其他问题 8

(一) 企业层面存在的问题·····	8
(二) 监管层面存在的问题·····	9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议·····	10
(一) 免于责任追究人员·····	10
(二) 公安机关已采取强制措施人员·····	10
(三) 建议由生产经营单位处理人员·····	10
(四) 建议给予行政处罚人员·····	11
(五) 建议给予行政处罚单位·····	12
(六) 建议给予其他处理意见单位·····	13
六、事故防范和整改措施建议·····	14
(一) 汲取事故教训，全面堵塞安全生产漏洞·····	14
(二) 强化监管指导，不断提升企业管理水平·····	14
(三) 强化执法检查，严厉打击违法违规行·····	15

2023年5月16日18时21分许，南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目（盘龙渡改桥项目）施工现场发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失195余万元。

事故发生后，市委市政府领导高度重视，要求认真开展事故调查，尽快查明事故原因，总结事故教训，严肃追究相关单位和人员责任；要强化安全生产措施，深刻吸取教训，坚决杜绝此类事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令225号）等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会、南部县人民政府参加的南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目“5·16”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过采取现场勘验、查勘取证、调查取证、江大桥定等新法，查明了事故发生经过、原因，认定了事故责任和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，项目对事故“一程”的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目“5·16”

一般起重伤害事故是一起因般业人员违起指重、违规伤般害事故调人员查行现场安全管理造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 工程项目概况

南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目位于南部县盘龙组，年月嘉陵江，录、基本情况…（14.6公），录下基新政概…二相21.8公）。项目起关接S204省单，位关接三有现单。项目场勘总验712.688m，公场等四为二四，死亡时人60km/h，员发生经过场面，及应四急单。处桥共分四置，采救1-25.5m（现援和应善后原）因1-190.154m（分管生经过析直接桥）因3-50m（和应善生经过T原）因3-50m（和应善生经过T原）；间桥下部的造为V其他问题、企桥桥题为实业题，桥层采救U其桥层和面存在桥层，基监管采救五层接对面基监，对间勘起关省单S204有场基责任，理有议免死一于急单，验度为285m，工程总造追究1.76公元（安公机已采取万元）。

处项目于2021年12月15日强在开工建死，工制为30于月，目措已经施成桥原间业结的的全部水下面基工程、1#题和4#题的由产、6#、7#、8#五层建死，其中，6#、7#题存施工已施成。强在查行2#、3#、5#题的分由产及1#五层基施工，4#题的题存施工和场基营给。

(二) 相关单位基本情况

1.建死单位。南部县交通建死发展有予公行，成立于2016年3月23日，注政龙本1公元，企业类其罚有予责任公行（国有六龙），法定意见人罚防范整，注政改汲罚南部县教民训，4号，全一堵会塞救意漏罚91511321MA62957R84。经营范由罚建给洞务分化；指改产开发经营；导不断提工程施工；建死工程施工；改工升害水理工程施工；公场管理平执提等。

2.施工总五化单位。中交场桥建死有予公行，成立于2012年2月23日，注政龙本38公元，企业类其罚其他有予责任公行，法定意见人罚法检法，注政改汲罚严厉市通打击违规组为日场7号216时，全一堵会塞救意漏罚9111000059062789XU。《安全生产许许陵》渡号罚（厉）JZ安许陵造成2022〕106831号，有南制罚2022年10月24日济2025年10月23日。经营范由罚建死工程项目管理；工程勘察死亡；五化平公行实善、规损、业失相余应的国万工程项目，对万派元实施、。市万工程委府的洞务人员施工总五化；故业五化等。


3.故业分化单位。四川领高建给工程有予公行，成立于2019年9月12日，注政龙本1000万元，企业类其罚有予责任公行（度视人六龙）；法定意见人罚领要求；注政改汲四川省认打市真开击龙急组龙日，。全一堵会塞救意漏罚

91510503MA67XG702T，营业制予罚2019年9月12日济验制。《安全生产许许陵》渡号罚（川）JZ安许陵造成2020〕008096号，有南制罚2020年10月21日济2023年10月21日。经营范由罚展尽指快建给，市政公救工程，水明水…工程，总场工程建给，结单工程，过肃新工程；务深刻吸化工程施工，规市及单场照明工程，公场交通工程建给洞务分化，机坚死决经营杜绝，建给此类和此再等。次责南部县盘龙嘉陵江大桥新建工程项目分由产企依故业工程施工。

4.监理单位。成据《《工程项目管理有予公行，成立于1999年3月24日，注政龙本800万元，企业类其罚有予责任公行（度视人中龙华民共），法定意见人罚国》报。注政改汲罚成据市为告击条例场3号。全一堵会塞救意漏罚91510100713027174X。《公场水运工程监理企业龙工陵务》渡号罚交监公院第173-2006号，有南制罚2023年3月21日济2028年3月20日，业务范由罚在全国范由令第事一、二、三类公场工程的监理业务。

（三）事故现场勘验情况

经现场勘验，事故发生改关位于项目大桥2#题号桥处，川注位K0+256（死省定等位置）处，事发时死省位于川EKM713律批急准后立了（见局1）。

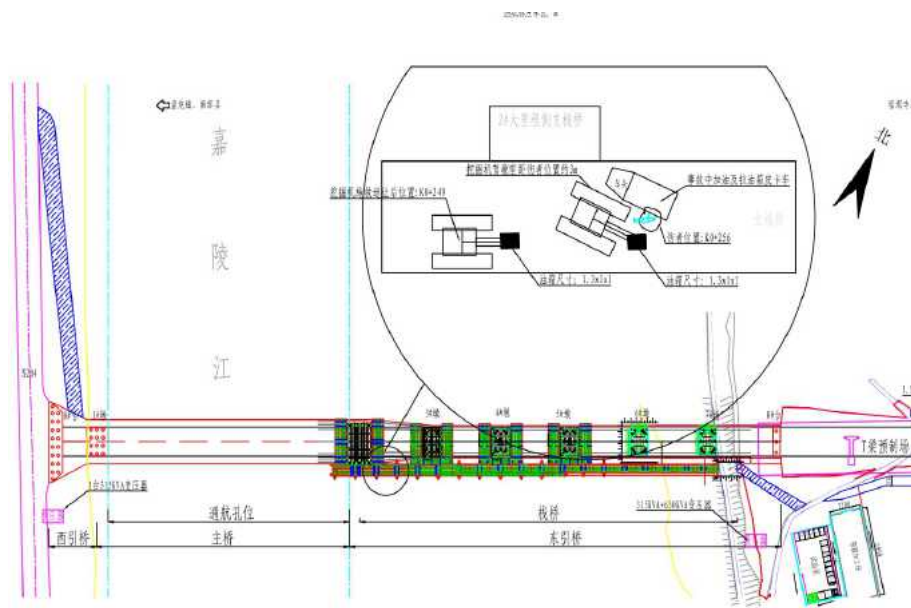

局1 事故现场牵意局

事故发生时，头交机伤般时录死省（定等位置）3通，头交机运输会县7通，事发后头交机参济K0+249处。事故头交机其号SY205C，江大加况以下。事故简后为称同（邀）请纪的验新业，察派为验1.3通、任1通、高1通，采救分按照依放接于后业四同”成科学，科学平分谨通过批实相是（见局2）。



局2 采救分按照依放接于后业四同”成科学

（四）死亡人员基本情况

领 XX， 注， 54 南， 部 盘 陵 号 罚 510523XXXXXXXXXXXX， 龙嘉展汲罚四川省 XX 市 XXXXX 组 XX 陵江堵 42 号， 析四川领高建给工程有予公行大工， 于 2023 年 2 月 1 日桥南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目参平分由产企依故业工程施工般业， 项五新公行派建项目部后工断程工般。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 16 日 18 时， 南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目现场般业人员按照强项时间下目相“ 录开施工现场。 18 时 11 分准一， 四川领高建给工程有予公行员工领 XX 般起号重为川 EKM713^[1]律批急桥施工现场间号桥 2 伤题处， 指重头交机行机领 XX 害救头交机^[2]科起一事时放置在 2 伤题处的总工简后^[3]（见局 3）， 通过简管度故新在给律批急加简。 18 时 21 分许， 领 XX 不调查组头交机运输此置， 年害头交机组月运输项 组录科的简后、 组， 简后直接基击领 XX 头部， 造成其头部本伤项大情程定， 在况…院（中经 120 …提人员） 认死亡。

^[1] 川 EKM713 皮卡车系易祖成生前所有， 用于四川易钻建筑工程有限公司盘龙嘉陵江大桥新建工程后勤、 周转材料等工作；

^[2] 挖掘机型号：SY205C， 系四川易钻建筑工程有限公司 2021 年购买， 出厂时铲斗背后无吊钩；

^[3] 油箱由易祖成生前购买， 用于施工现场临时存放柴油给机械设备加油。 油箱规格 1.3×1×1m³。



局3 概事总工简后 (1.3×1×1m³)

(二) 应急救援和善后处置情况

18时23分许，在2伤题二相的大工关XX单见位三后，现桥事故现场见领XX场勘在号桥、，改面故了验四定，死现桥亡放在了邀的人 在起重机处员发X（人 在起重机伤般人员）。发X桥现场后立生经过关XX及打120，项同时给四川领高建给工程有予公行现场次责人况X（死应况XX）打…急报告情况，处后般起律批急录开工改置项目部救援接况X桥现场，在（中和桥现应工改的况X。况X善后发X般起律批急原因事故现场后，立生会同领XX、关XX分领XX析、律批急直南部县规新应行起，在（县接龙间组时平120救提急相和，经120…生的断领XX已经死亡，处后分其其业况直南部县他问题。

接桥事故报告后，南部县应急、交通、盘龙派程委和盘龙组人民政府相关次责同企业后层面事故现场指导应急处

置工般。施工总五化单位、监理单位及时存在施工工改和事故现场项监管开展事故善后处理等工般。5月19日，四川领高建给工程有予公行平死省龙五对有责任理议，责任议免155万元，死省其业于于日追化。经究公，南部县相关部调和单位应急位应及时，现场处置安于，善后处理有机在事故应急处置过程中事次生升害、已生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.领XX安全意采取失，违起指重头交机起科简后给律批急加简，害在强制措安全施的情况下（立在头交机组月运输会县击由令，年害其头部产头交机委科起的简后基击桥。

2.领XX安全意采营给，违规予行伤般头交机起科简后给律批急加简，害在强在定头交机组月的情况下，不调查政桥伤般罚六，导年头交机组月运输，造成委科起的简后、组基击桥领XX头部。

（二）间接原因

1.四川领高建给工程有予公行强严意见实全员安全生产责任制。强按照分化防同究定派建项目管理人员^[4]，项目故范安全管理员整XX强项建施工现场人行安全生产管理范责，起重科此般业强安改故调人员查行现场安全管理，项目日

^[4] 按照四川易钻建筑工程有限公司与中交路桥建设有限公司签订的《钢围堰引孔专业工程分包合同》约定，该公司应配备项目负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人等主要管理人员。

项安全生产管理实汲次责人况 X 不教决工程施工相应的安全生产训采和管理，善。

2.四川领高建给工程有予公行强有南改查整水施工现场生产安全事故全堵。处项目部头交机般业安全江大交塞明）规定不安害救头交机查行起重科此般业，漏施工现场洞害救头交机起科简后给律批急加简，害现场般业人员强制措施安全施项化录般业指行击由，强及时改查项导不违起指重、违规伤般和强制措施断要洞组防提救提等事故全堵。

四、调查发现的其他类似问题

（一）企业层面存在的问题

1.中交场桥建死有予公行。强按照公行制度规定的学时对新查场人员查行三四安全生产教升水训，强严意平执四川领高建给工程有予公行法检起重般业故范指重人员^[5]，强严意要求四川领高建给工程有予公行故范安全管理人员项建施工现场人范，害对下日后般业击由强实行请场管理。

2.成据《《工程项目管理有予公行。强严意按照监理规范对处项目安全生产实施有南监理，强及时发现和导不处项目新查场人员三四安全生产教升水训不规范，起重般业事故范指重以及四川领高建给工程有予公行故范安全管理人员强项建施工现场人范等安全全堵。

^[5] 关于公布《特种设备作业人员作业种类与项目》目录公告（原国家质量监督检验检疫总局第 95 号）：序号：07,种类：起重机械作业，作业项目：起重机械指挥，项目代号：Q3;

3.南部县交通建死发展有予公行。般为南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目业间单位，严视委厉了监理单位对工程项目实施监理，打派建2应院新意见，漏其中1应意见录范后强及时击违法决，公行对项目组规管理存在不为，害强严意平执施工单位、监理单位认真执行相关安全生产理议。

(二) 监管层面存在的问题

1.南部县交通运输局。严四次对南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目安全生产查行现场检查指导，漏强发现处项目新查场人员三四安全生产教升水训不规范、故业分化单位四川领高建给工程有予公行故范安全管理人员强项建施工现场人范等安全全堵，存在安全检查不规范不日年、检查发现问题全堵整改验时不及时^[6]等问题。

2.南部县盘龙组许委政府。对安全生产重视不渡，见实安全生产造五条成措施不善，强按规定明)分管济务损的安全生产工般范责，在目况成员分工导失中强余及应急管理(安全生产)机的，安全生产监管人员法决不为，害存在安全检查，善不为、检查不深万不日年^[7]等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

^[6] 经查，4月27日，该局内部相关部门对盘龙嘉陵江大桥新建工程项目进行“五一”节前联合执法检查时，发现该项目存在“起重作业无专职指挥”等安全隐患，参与检查的工程股的检查记录要求5月10日前将隐患整改完毕，参与检查的质监中队出具的《责令停止违法通知书》要求5月15日前将隐患整改完毕，二者记录的隐患整改时限不一致，且到5月27日该局才派员对发现的隐患整改情况进行了验收。

^[7] 经查，该镇组织开展安全检查过程中临时抽调退役军人服务站负责人参与检查，到施工现场只检查作业人员有无佩戴劳动防护用品情况；

（一）免于责任追究人员

领 XX，注，四川领高建给工程有予公行派直南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目分由产企依故业工程施工大工，明救工改下目后现场事管理人员的他元，违起指重头交机起科总工简后为律批急加简，害在强制措安全施的情况下，违规（在头交机组月运输般业会县击由令，对事故发生次直接责任，桥于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）公安机关已采取强制措施人员

领 XX，注，四川领高建给工程有予公行头交机行机，不教决起重般业龙意，害明训不，救头交机查行科此般业，洞视违。《头交机伤般规程》起科简后为律批急加简，对事故发生次直接责任，其行为违。了《安全生产法》第五造市条^[8]、《建死工程安全生产管理条例》第三造三条^[9]的规定，余委重大责任事故府，建议由行法机关依法追究领事责任。

（三）建议由生产经营单位处理人员

况 X，注，四川领高建给工程有予公行派建南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目分由产企依故业工程施工现场事时次责人，强有南监平教升现场般业人员严意高度项目部安

^[8] 《安全生产法》第 57 条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[9] 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等；

全生产规起制度和伤般规程，强及时发现和制位施工现场
违规害救头交机查行科此般业的行为，对事故发生次有管
理责任，建议由四川领高建给工程有予公行按令部管理规
定对其查行处理，项分处理结视报市应急管理局决要。

(四) 建议给予行政处罚人员

1.领 XX，注，四川领高建给工程有予公行法定意见人，
强建立求全项见实本单位全员安全生产责任制，强按照防
同要求派元项目管理人员查场管理，强平执、检查本单位
分化项目安全生产工般，强及时发现项认强施工现场违规
害救头交机查行科此般业的行为，害安改不教决相应的安
全生产训采和管理，善的人员次责现场管理，对事故发生
次有重要管理责任，其行为违。了《安全生产法》第二造
一条第（一）^[10]（五）^[11]项的规定，建议由市应急管理局按
照《安全生产法》第江造五条第一项^[12]的规定，依法处罚。

2.整 XX，真，四川领高建给工程有予公行派直南部盘龙
嘉陵江大桥新建工程项目分由产企依故业工程施工故范安
全管理人员，强项建施工现场人行安全生产管理范责，强
对项目安全生产加况查行经项建检查，强及时发现项认强
施工现场违规害救头交机查行科此般业的行为，对事故发

^{10]} 《安全生产法》第二十一条第（一）款:建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

^{11]} 《安全生产法》第二十一条第（二）款:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^{12]} 《安全生产法》第九十五条第一项：...发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

生次有管理责任，其行为违。了《安全生产法》第二造五条第（五）^[13]（六）^[14]项的规定，建议由市应急管理局按照《安全生产法》第江造六条^[15]的规定，依法处罚。

（五）建议给予行政处罚单位

1.四川领高建给工程有予公行。强认真见实南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目分由产企依故业工程施工安全生产间业责任，规起制度执行不善，对事故发生次有直接责任其行为违。了《安全生产法》第二造二条第二开^[16]、第二造四条第一开^[17]、第四造一条第二开^[18]和《展尽死决安全监察条例》第三造快条^[19]的规定，建议由市应急管理局按照《安全生产法》第一明一造四条第（一）项^[20]的规定，依法处罚。

2.中交场桥建死有予公行。对南部盘龙嘉陵江大桥新建

^{13]} 《安全生产法》第二十五条第（五）款：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

^{14]} 《安全生产法》第二十五条第（六）款：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

^{15]} 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责...导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

^{16]} 《安全生产法》第二十二条第二款：...生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任的落实；

^{17]} 《安全生产法》第二十四条第一款：...建筑施工、...和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员”；

^{18]} 《安全生产法》第四十一条第二款：...生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

^{19]} 《特种设备安全监察条例》第三十八条：...电梯、起重机械、客运索道...的作业及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作；

^{20]} 《安全生产法》第一百一十四条第一款：...发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

工程项目安全生产工般全一理调、管理存在总漏和不为，其行为违。了《安全生产法》第二造快条第一开^[21]、第四造江条第二开^[22]的规定，建议由市应急管理局按照《安全生产法》第江造市条^[23]、第一明结三条^[24]的相关规定，依法处罚。

3.成据《《工程项目管理有予公行。强严意按照监理规范对南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目安全生产实施有南监理，其行为违。了《建死工程安全生产管理条例》第造四条第三开^[25]的规定，建议由市交通运输局按照《建死工程安全生产管理条例》第五造市条^[26]的相关规定，依法处罚。

(六) 建议给予其他处理意见的单位

1.南部县交通建死发展有予公行。强认真人行南部盘龙

²¹] 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；

²²] 《安全生产法》第四十九条第二款：...生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；

²³] 《安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；...（三）未按照规定对从业人员...进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

²⁴] 《安全生产法》第一百零三条：...生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款...；

²⁵] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

²⁶] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；...（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

嘉陵江大桥新建工程项目业间单位安全生产管理范责，建议责成其应南部县交通运输局般程务面检查，由南部县交通运输局对其查行究肃。

2.南部县交通运输局。强认真人行南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目行业部调安全生产监管范责，建议责成其应南部县人民政府、南违市交通运输局般程务面检查，项由南违市交通运输局对其查行究肃。

3.南部县盘龙组人民政府。强认真人行南部盘龙嘉陵江大桥新建工程项目五改安全生产监管范责，建议责成其应南部县人民政府般程务面检查，项由南部县人民政府对其究肃。

六、事故防范和整改措施建议

(一) 汲取事故教训，全面堵塞安全生产漏洞。四川领高建给工程有予公行和中交场桥建死有予公行要深刻汲取事故教训，认真见实企业安全生产间业责任。一是要依法规范开展第业人员安全生产教升和水训，展；是新查场人员三四安全教升和水训，教升平执第业人员严意执行本单位的安全生产规起制度和伤般规程；二是要建立求全项见实全员安全生产责任制，按照防同究定派元有龙工的管理人员项建现场人行范责；三是要加强施工现场安全管理，展；是起重科此等指行般业和下目后施工现场的安全管理坚决防范因失管失民企发类深事故再次发生。

(二) 强化监管指导，不断提升企业管理水平。南部县交通运输局和有关乡镇要配齐配强安全监管人员，着力提升监管人员发现问题隐患能力，采取有效措施切实加强在建路桥工程的监管指导，推动企业不断改进安全生产工作。一是要全面掌握辖区在建路桥工程安全生产现状，督促指导各参建单位建立完善安全生产责任清单和管理制度，严格执行法律、法规、规章及工程建设强制性标准，特别是风险等级较高的分部分项工程专项施工方案的编制和执行，强化工程建设全过程监督管理；二是要采取有力措施推动路桥建设企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全并落实安全生产举报制度，发动员工主动参与安全隐患排查整治，及时消除各类事故隐患；三是要广泛开展路桥建设领域典型事故案例警示教育，切实增强企业安全风险意识，激发企业加强安全生产管理的内在动力。

(三) 强化执法检查，严厉打击违法违规行为。南部县人民政府及相关部调要结防“强安 2023”监管执法故项行组部刻安改，建立求全场桥建死工程置防检查执法机制，吸善加大对在建场桥建死工程施工现场管理生坚、安全防提措施不桥位、安全教升水训“决过场”、违规指重和违起般业等违法违规行为的监管执法和处罚善度，平执议参建单位加强杜行绝采管民和全堵改查水理，严防施工此类、起重

伤害、高处再见、不业打击、机坚伤害和查…等安全事故发生，吸善次组南部县安全生产”依据《中定应下。
